

УДК 355.07

**Процесс предоставления земельных участков
органам пограничной службы
для создания инженерной инфраструктуры государственной границы
Республики Беларусь**

Гришко В. Д., Товстик С.Н.

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»

Согласно действующему законодательству Республики Беларусь, все элементы инженерной инфраструктуры Государственной границы должны размещаться исключительно на земельных участках, представленных в пользование органам пограничной службы Республики Беларусь.

Несмотря на то, что законодательством Республики Беларусь определён порядок изъятия и предоставление земельных участков в пользование субъектам хозяйствования продолжительность процесса его реализации на практике существенно варьируется, что не оправдано затягивает сроки создания инженерной инфраструктуры Государственной границы Республики Беларусь. Причинами такого положения дел видится отсутствие в органах пограничной службы Республики Беларусь единого регламентированного подхода к организации и проведению процедуры изъятия земельных участков для строительства инженерной инфраструктуры Государственной границы однозначно определяющего не только последовательность и сроки выполнения соответствующих операций, а и их исполнителей в территориальных органах пограничной службы.

На основе проведенного анализа требований соответствующих нормативных правовых актов [1–2], опыта осуществления процедуры

изъятия земельных участков для строительства инженерной инфраструктуры Государственной границы должностными различными территориальными органами пограничной службы разработан детальный алгоритм действий должностных лиц управления территориального пограничной службы, контекстная диаграмма и диаграмма декомпозиции [3] которого приведены на рисунках 1 и 2 соответственно.



Рисунок 1 – Контекстная диаграмма процесса изъятия земельного участка и предоставление его органам пограничной службы

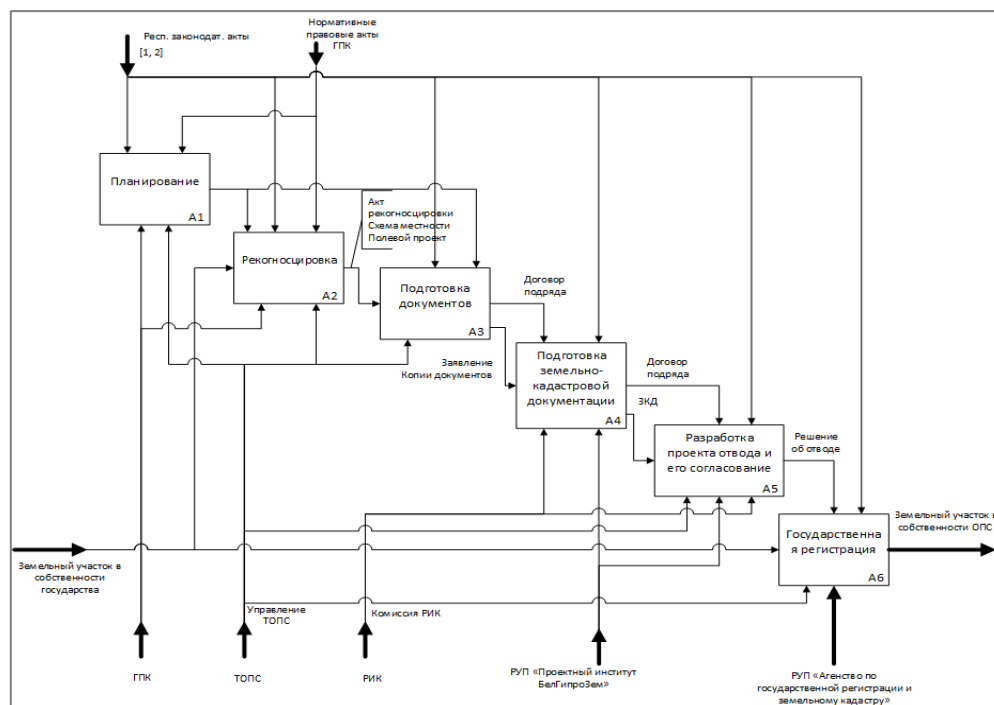


Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции процесса изъятия земельного участка и предоставление его органам пограничной службы

В материалах доклада детально рассматривается содержание работ на каждом этапе выполнения процесса, предлагаются не только их исполнители, а и должностные лица, на которых возложен контроль за качеством и своевременностью их (работ) выполнения.

Внедрение представленного алгоритма в деятельность органов пограничной службы Республики Беларусь позволит унифицировать деятельность должностных лиц территориального органа пограничной службы по изъятию и предоставлению земельного участка и в последующем в кратчайшие сроки осуществить её изъятие в собственность органов пограничной службы Республики Беларусь, что обеспечит не только плановость, а, соответственно, и контролируемость данного процесса, но и в целом оптимизирует работы на начальном этапе создания инженерной инфраструктуры Государственной границы.

Литература

1. Об изъятии и предоставлении земельных участков [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь от 27 декабря 2007г. № 667 // ЗАО «КонсультантПлюс». – Минск, 2018.

2. О развитии и модернизации инфраструктуры Государственной границы Республики Беларусь и приграничной территории: Указ Президента Респ. Беларусь от 7 августа 2014г. № 402 // ЗАО «КонсультантПлюс». – Минск, 2018.

3. Марка, Д., МакГоуэн, К. Методология структурного анализа и проектирования SADT / Д. Марка.– М.: Метатехнология.– 1993.– 240 с.
